


進捗状況(2023年9月)

① 高速道路の橋脚(PE-1)基礎工事に於いて、中掘杭工法を用いて鋼管杭を順次打設中。



② 高速道路の橋脚(PPE-4)基礎工事に於いて、オールケーシング工法を用いて地中障害物の撤去中。

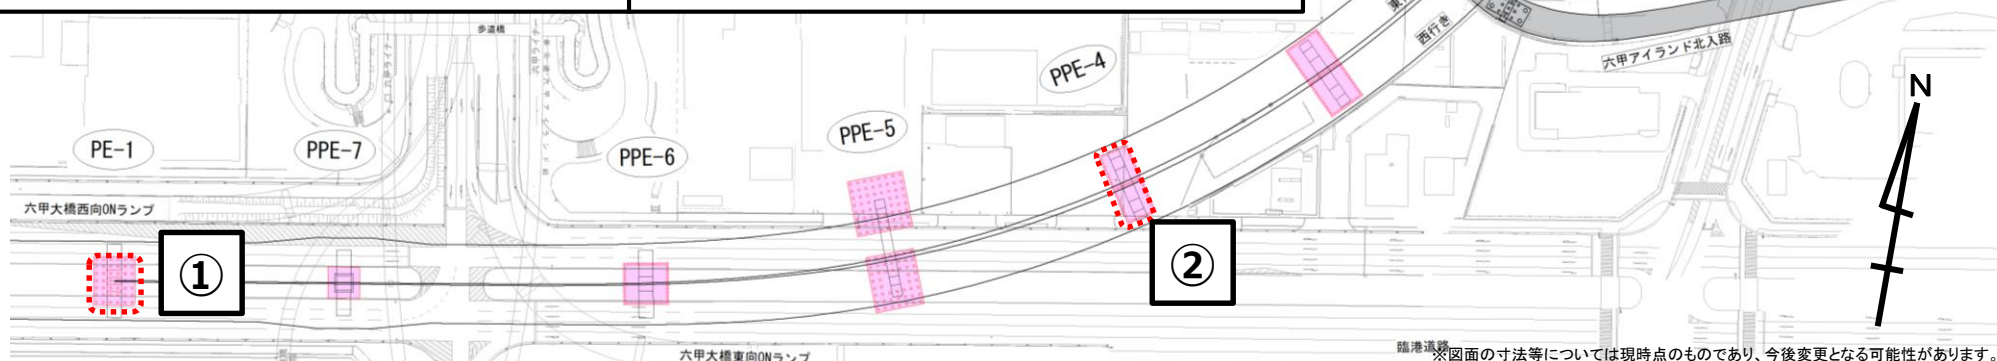

※図面の寸法等については現時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

