

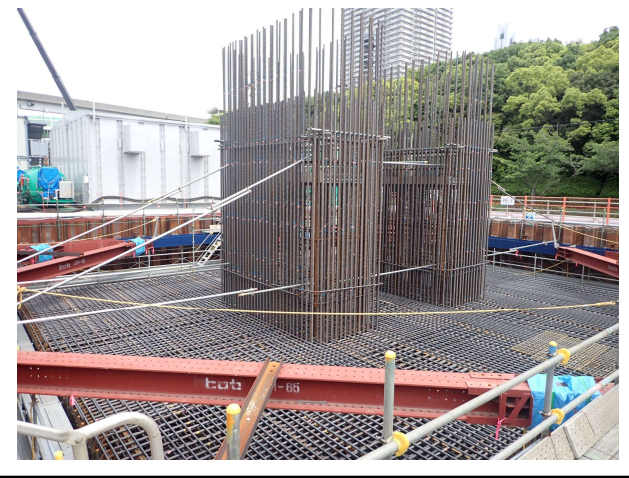


進捗状況(2024年5月)

【1】高速道路の橋脚(PE-1)基礎工事に於いて、フーチング・橋脚構築に向けた鉄筋組立中。

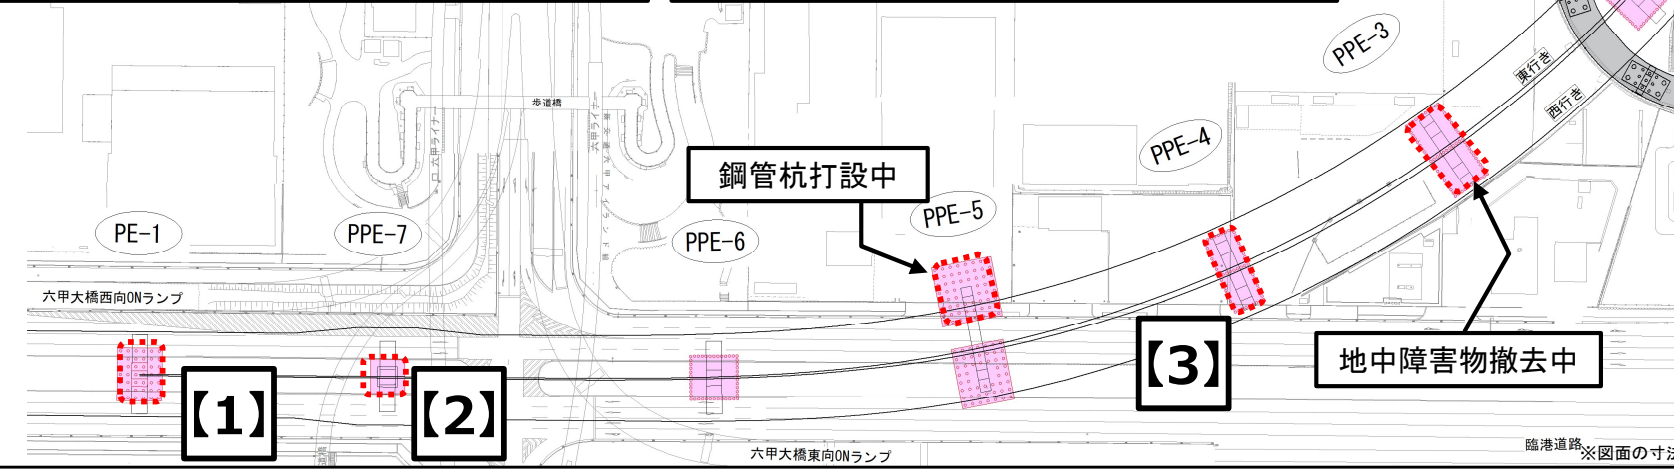

【2】高速道路の橋脚(PPE-7)ニューマチックケーソン基礎工事に於いて、2ロット目の鉄筋組立中。

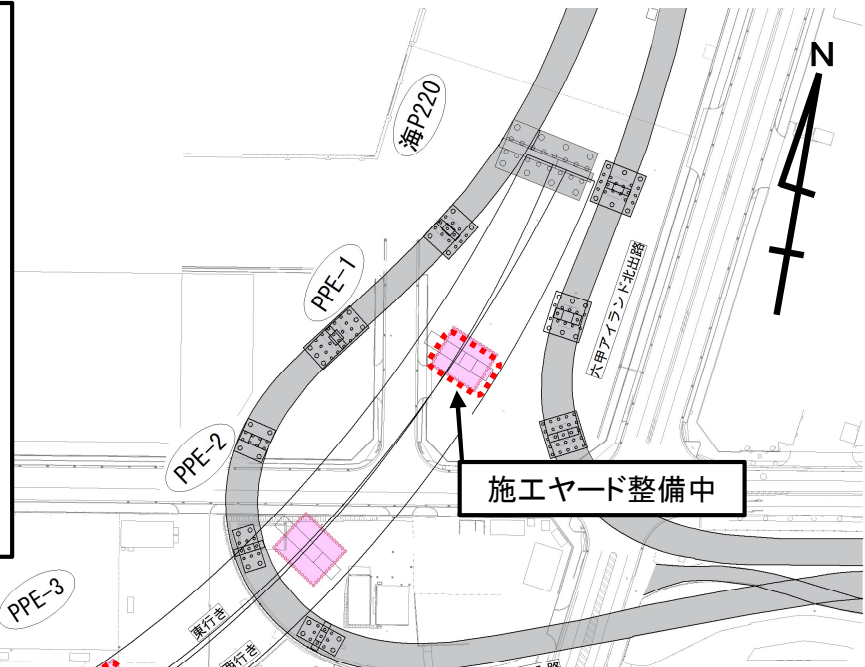

【3】高速道路の橋脚(PPE-4)基礎工事に於いて、鋼管矢板基礎施工前の先行削孔中。

