

# 進捗状況(2024年3月)



【1】高速道路の橋脚(PE-1)基礎工事に於いて、フーチング構築に向けた均しコンクリート※打設完了。




【2】高速道路の橋脚(PPE-7)ニューマチックケーソン基礎工事に於いて、1ロット目の鉄筋組立中。




※均しコンクリート(ならしコンクリート):  
凹凸がある面にコンクリートを打設する際、凹凸面を平らにして型枠を設置しやすくなるための厚さ数センチ程度の薄いコンクリートのこと。

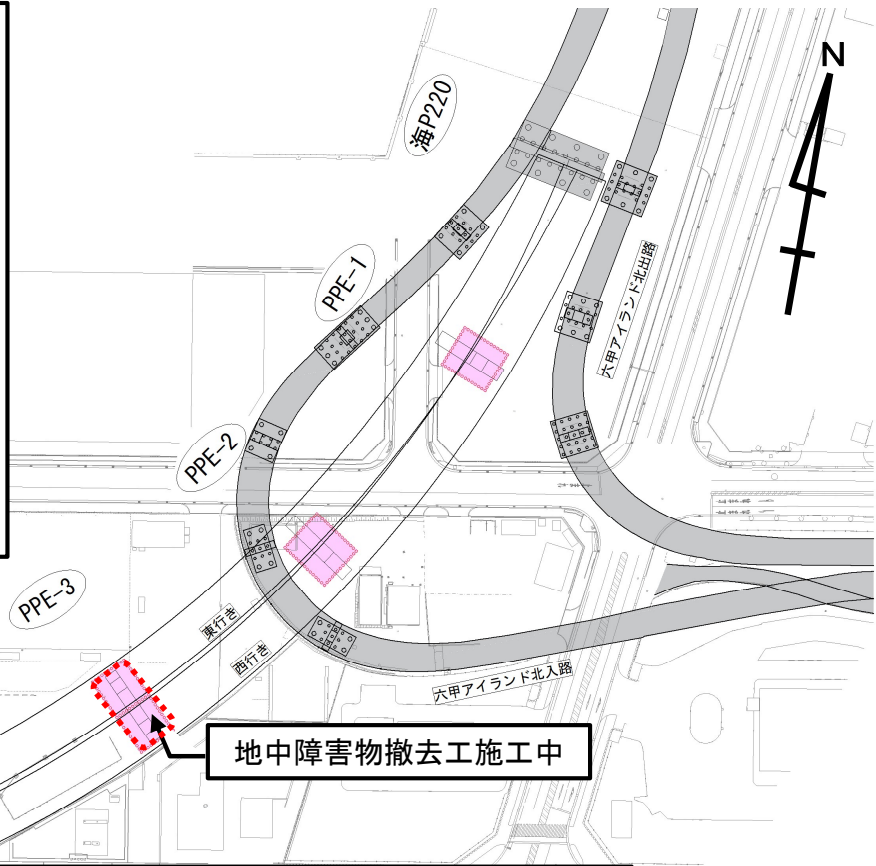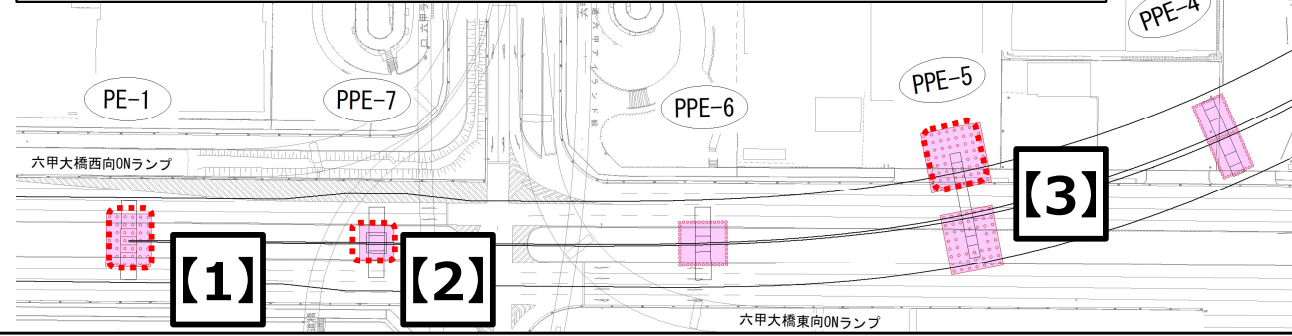

【3】高速道路の橋脚(PPE-5R)基礎工事に於いて、鋼管杭の打設中。

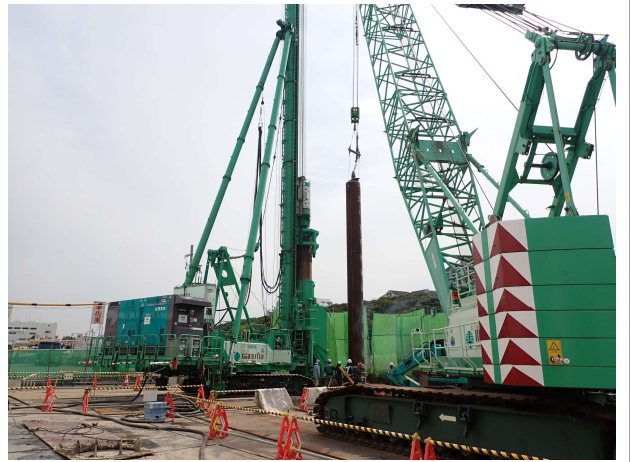

縦断面図 (西行)

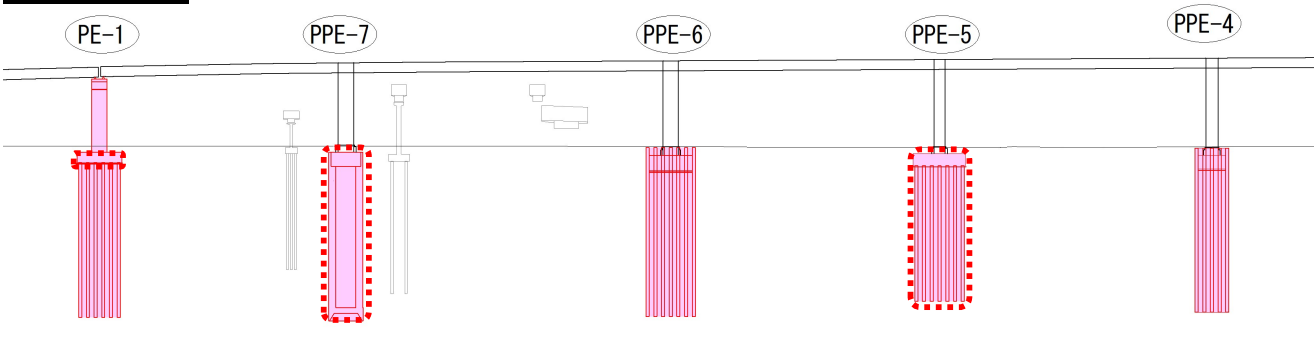

今後変更となる可能性があります。

